

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
계속	예산	임기 내	자체	중기

공약사항

- ◇ 문화·예술·축제 등 다양한 콘텐츠가 연중 개최되는 문화·휴식 공간으로 활용 및 국내외 관광객과 시민에게 사랑받는 안산대표 랜드마크로 육성

I. 정책목표



- 안산문화광장내 산재되어 있는 시설물, 주변건물, 도로시설물 등으로 인한 도시광장 이미지 개선
- 지역예술인들의 창작활동 및 상시 공연(버스킹 등)을 통한 시민 문화향유 기회 확대 및 도시브랜드 가치 제고

II. 사업 추진현황

- 사업명 : 안산문화광장 야외공연장 개선사업
- 위치 : 단원구 광덕대로 157 / 썬큰광장
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 900백만원 (경기도 특별조정교부금)
- 주요내용 : 야외공연장 리모델링, 소규모 공연장(기존 막구조물 이전 설치)
- 추진실적 및 계획
 - 구조심의 및 디자인 심의 : 2022. 7. ~ 8.
 - 실시설계 용역 완료 : 2022. 11.
 - 일상감사 및 계약심사 실시 : 2022. 11.
 - 공사 착공 : 2022. 11.
 - 공사 준공 : 2022. 12.

III. 추진계획

- 위 치 : 단원구 광덕대로 157 / 글로벌광장 ~ 숲의광장
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 소요예산 : 4,000백만원 (시비)
- 주요내용
 - 인근 상인 및 주민, 지역예술가, 외부전문가 등의 다각적인 의견 수렴
 - 문화광장 내 광장별 다양한 개성이 공존하는 공간 조성
- 추진일정

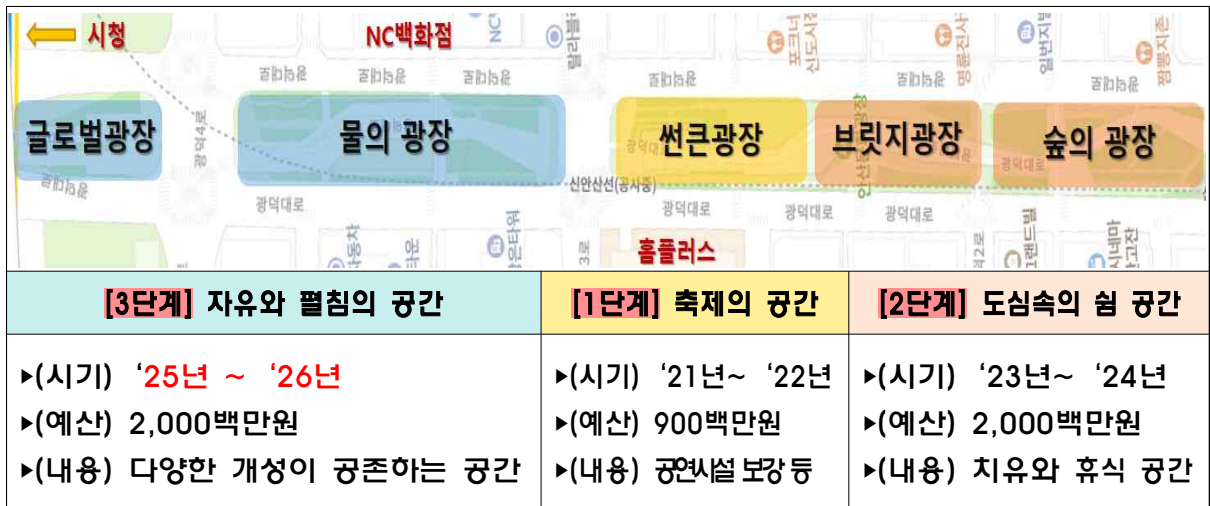

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공간구성 기본 계획 수립																					
광장별 공간조성 추진																					

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
문화광장 문화예술공 간 조성	문화광장 예술공간 조성	썬큰광장 야외공연장 개선사업	기본계획수립 - 공간구상용역 - 시민·전문가 의견 수립	2단계조성 (브릿지, 숲의광 장)	3단계조성 (글로벌, 물의광 장)	광장별 공간조성 추진완료

V. 연차별 투자계획

- 총 사업비 : 4,900백만원
- 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	입기후
계	4,900	900	2,000	2,000	-	-	-
재원 별	국비	-	-	-	-	-	-
	도비	900	900	-	-	-	-
	시비	4,000	-	2,000	2,000	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

- 사업 추진예산 확보를 위해 특교세 또는 특조금 지원 필요

공약실명제				
추진부서	문화예술과	과장	이영분	☎ 481-2060
		문화종교팀장	박향미	☎ 481-2062
		담당자	강지훈	☎ 481-2797
